



معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

التخطيط التشغيلي ومتابعة الأداء

من الخطة إلى التنفيذ

المدرّب: عمر بن راشد الشعبي

مقدمة الدورة

التخطيط التشغيلي هو الحلقة التي تربط بين التوجه الاستراتيجي والعمل اليومي داخل الجهة. فوجود خطة استراتيجية وحده لا يكفي، لأن النجاح الحقيقي يبدأ عندما تتحول الأهداف العامة إلى:

6
ومتابعة دورية

5
مؤشرات أداء

4
جداول زمنية

3
مسؤوليات معروفة

2
مهام محددة

1
مشاريع واضحة

الرسالة الأساسية للدورة:

الخطة الناجحة ليست التي تكتب بصورة جيدة فقط، بل التي يمكن تنفيذها وقياسها ومتابعتها وتحويلها إلى نتائج.

أهداف الدورة

بنهاية الدورة يكون المشارك قادرًا على:

1 التمييز بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية.

2 تحويل الأهداف العامة إلى أهداف تشغيلية قابلة للتنفيذ.

3 تحويل الأهداف التشغيلية إلى مشاريع ومهام واضحة.

4 تحديد المسؤوليات الإدارية عن التنفيذ والمتابعة والاعتماد.

5 صياغة مؤشرات أداء قابلة للقياس.

6 بناء مصفوفة لمتابعة الأداء.

7 قراءة نسب الإنجاز وحالات التعثر.

8 إعداد تقرير أداء مختصر يدعم اتخاذ القرار.

9 التعامل مع المخاطر والتصعيد الإداري عند الحاجة.

المحور الأول

أساسيات التخطيط التشغيلي

ما التخطيط التشغيلي؟

التخطيط التشغيلي هو تحويل الأهداف والتوجهات الاستراتيجية إلى أعمال محددة قابلة للتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة، عادة لا تتجاوز سنة.

ويجب عن أسئلة واضحة:

كيف سنعرف أننا نجحنا؟

متى يبدأ ومتى ينتهي؟

من المسؤول؟

كيف سننجزه؟

ماذا سننجز؟

مثال:

إذا كان الهدف الاستراتيجي هو تحسين تجربة المستفيدين، فقد تتضمن الخطة التشغيلية مشروعًا لتطوير نظام المواعيد، ومشروعًا لتطوير الخدمات الإلكترونية، ومشروعًا لتأهيل موظفي المستقبل.

لماذا نحتاج إلى التخطيط التشغيلي؟

لأن الأهداف العامة لا تتحقق تلقائيًا.

التخطيط التشغيلي يساعد على:

1 تحويل التوجهات إلى أعمال فعلية.

2 تحديد الأولويات.

3 تنظيم المشاريع والمهام.

4 توزيع المسؤوليات.

5 تنظيم الوقت والموارد.

6 متابعة التنفيذ.

7 اكتشاف التعثر مبكرًا.

8 اتخاذ قرارات مبنية على بيانات.

لماذا تتعثر الخطط؟

1. خطة بلا مشاريع ومهام

المعنى:

توجد أهداف مكتوبة، ولكن لم يتم تحويلها إلى أعمال محددة قابلة للتنفيذ.

مثال:

نكتب في الخطة:
تحسين جودة الخدمات.
ولكن لا نحدد ما المشاريع التي ستنفذ لتحقيق هذا الهدف.

2. مشاريع ومهام بلا مسؤول

المعنى:

توجد أعمال واضحة، ولكن لا يوجد شخص أو إدارة محددة تتحمل مسؤولية تنفيذها.

مثال:

مشروع تحديث دليل الإجراءات، دون تحديد الإدارة المسؤولة عن التنفيذ والاعتماد.

3. مسؤول بلا متابعة

المعنى:

تم تحديد المسؤول، ولكن لا توجد مؤشرات أو اجتماعات متابعة أو تقارير دورية.

النتيجة:

قد نكتشف التأخر في نهاية الفترة بدل اكتشافه أثناء التنفيذ.

رحلة الخطة من الاستراتيجية إلى التنفيذ

تمر الخطة بعدة مراحل مترابطة:

1. الخطة الاستراتيجية	تحدد الاتجاه العام والأهداف بعيدة المدى. السؤال: أين نريد أن نصل؟
2. الخطة التشغيلية	تحدد ما الذي سننفذه خلال السنة لتحقيق تلك الأهداف. السؤال: ماذا سنفعل خلال هذه السنة؟
3. المشاريع	تحول الهدف التشغيلي إلى أعمال رئيسية منظمة يمكن إدارتها ومتابعتها.
4. المهام	هي الأعمال التفصيلية التي يجب تنفيذها لإنجاز المشروع.
5. مؤشرات الأداء	تقيس مدى التقدم والإنجاز.
6. المتابعة	تقارن بين المنجز والمستهدف.
7. التقرير	يعرض الوضع لمتخذ القرار ويحدد ما يحتاج إلى تدخل أو اعتماد.

الفرق بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية

الخطة التشغيلية

● الأفق الزمني: سنة أو أقل.

● تركيز على التنفيذ.

● تتضمن أهدافًا تشغيلية ومشاريع ومهام ومؤشرات.

● تنفذها الإدارات والأقسام وفرق العمل.

مثال:

خفض متوسط زمن الانتظار من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة بنهاية العام.

الخطة الاستراتيجية

● الأفق الزمني: غالبًا من 3 إلى 5 سنوات.

● تركيز على الاتجاه العام.

● تتضمن أهدافًا وتوجهات كبرى.

● تقودها الإدارة العليا.

مثال:

رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

مكونات الخطة التشغيلية

1 الهدف

النتيجة التي نريد الوصول إليها.

2 المشروع

مجموعة من الأعمال والمهام المترابطة التي
تتخذ خلال فترة زمنية محددة لتحقيق هدف أو
نتيجة واضحة.
مثال: مشروع تطوير نظام المواعيد
المسبقة.

3 المهمة

عمل محدد داخل المشروع له بداية ونهاية
ومسؤول واضح.
مثال: إعداد نموذج الحجز الإلكتروني.

4 مسؤول التنفيذ

الشخص أو الفريق الذي ينفذ المهمة فعليًا.

5 المسؤول المعتمد

الشخص الذي يتحمل المسؤولية النهائية عن
النتيجة ويعتمدها.

6 الجدول الزمني

يحدد مواعيد البداية والنهاية ونقاط التحقق
أثناء التنفيذ.

7 مؤشر الأداء

يحدد كيف نقيس التقدم أو النتيجة.

8 المستهدف

القيمة التي نريد الوصول إليها.

دورة التخطيط والمتابعة



الخلاصة:

التخطيط ليس وثيقة ثابتة، بل دورة مستمرة من التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتحسين.

ترتيب الأولويات

يمكن تصنيف الأعمال وفق الأهمية والإلحاح:

مهم وغير عاجل

يحتاج إلى تخطيط وتخصيص وقت.
مثال: إعداد مشروع لتطوير الإجراءات أو مشروع لتأهيل الموظفين.
وهذه الفئة هي التي تصنع التحسين المستقبلي.

مهم وعاجل

يحتاج إلى التنفيذ فوراً.
مثال: تعطل نظام استقبال المراجعين.

غير مهم وغير عاجل

يمكن تأجيله أو حذفه إذا لم يخدم أهداف الجهة.

عاجل وغير مهم

يمكن تفويضه إلى شخص آخر.

المحور الثاني

تحويل الأهداف إلى مشاريع ومهام

صياغة الهدف التشغيلي

الهدف التشغيلي الجيد يجب أن يوضح أربعة عناصر:

1. الفعل

رفع
خفض
زيادة
تقليص
إطلاق
استكمال
اعتماد

2. الموضوع

ما الذي سنغيره؟

3. مقدار التغيير

كم نريد أن نحقق؟

4. الإطار الزمني

متى نريد تحقيقه؟

مثال على هدف تشغيلي واضح

بدل أن نقول:

تحسين رضا المستفيدين

نقول:

رفع نسبة رضا المستفيدين من 70% إلى 85% بنهاية الربع الرابع.

هنا أصبح الهدف واضحًا وقابلًا للقياس والمتابعة.

من الهدف إلى المشروع إلى المهمة

الهدف

هو النتيجة التي نريد الوصول إليها.
مثال: خفض متوسط زمن الانتظار من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة.

المشروع

هو عمل رئيسي منظم يساهم في تحقيق الهدف ويضم عددًا من المهام.
مثال: مشروع تطوير نظام المواعيد المسبقة.

المهمة

هي عمل محدد داخل المشروع يمكن إسناده وإنهائه.
مثال: إعداد نموذج الحجز الإلكتروني.

الفرق بين المشروع والمهمة

المهمة


- أصغر وأكثر تحديدًا.
- تنفذ كجزء من المشروع.
- لها بداية ونهاية واضحة.
- لها مسؤول تنفيذ.
- ينتج عنها مخرج محدد.

المشروع

- أكبر وأشمل.
- يضم عدة مهام.
- له هدف أو نتيجة واضحة.
- له مدة زمنية محددة.
- قد يشترك في تنفيذه أكثر من قسم.
- له مسؤول عن المشروع.

المشروع:
تطوير نظام استقبال المستفيدين.

المهام:

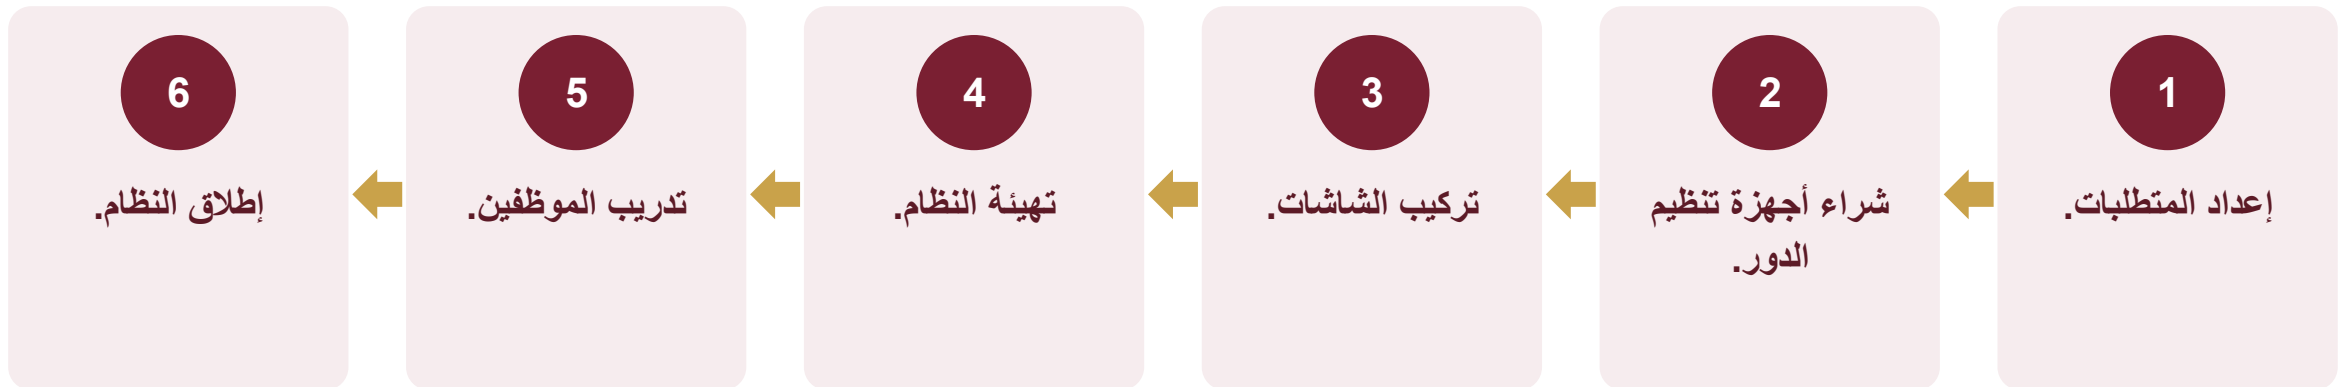

هيكل المشروع والمهام



القاعدة:

كل مهمة يجب أن يكون لها مخرج واضح يثبت أنها انتهت.

إسناد المسؤوليات

وضوح المسؤوليات يمنع تداخل الأدوار ويجعل المتابعة والمساءلة أكثر فاعلية.
يمكن توزيع الأدوار كالتالي:

الجهة المطلعة

الجهة التي يجب إبلاغها بمستوى التقدم دون أن تشارك مباشرة في التنفيذ.

مثال:

المدير العام.
مكتب الرئيس التنفيذي.
رئيس القطاع.

الجهة الاستشارية

الجهة التي نحتاج إلى رأيها قبل اتخاذ القرار أو استكمال المهمة.

مثال:

الدائرة القانونية.
دائرة تقنية المعلومات.
الدائرة المالية.
بحسب طبيعة المشروع.

المسؤول المعتمد

الشخص الذي يعتمد النتيجة ويتحمل المسؤولية الإدارية النهائية عنها.

مثال:

مدير دائرة الموارد البشرية.
يفضل أن يكون لكل مهمة مسؤول معتمد واحد فقط.

مسؤول التنفيذ

الموظف أو الفريق الذي يقوم بتنفيذ المهمة فعليًا.

مثال:

أخصائي التدريب والتطوير يعد خطة التدريب.

مثال متكامل لإسناد المسؤوليات


المشروع	تطوير دليل إجراءات خدمة المستفيدين.
المهمة	إعداد النسخة المحدثّة من الدليل.
مسؤول التنفيذ	أخصائي الجودة والتطوير المؤسسي.
المسؤول المعتمد	مدير دائرة خدمات المستفيدين.
الجهة الاستشارية	الدائرة القانونية ودائرة تقنية المعلومات.
الجهة المطلعة	المدير العام.

المعالم الزمنية للمشروع

الموعد النهائي وحده لا يكفي.

يجب تقسيم المشروع إلى مراحل تساعدنا على اكتشاف التأخر مبكرًا.

مثال:

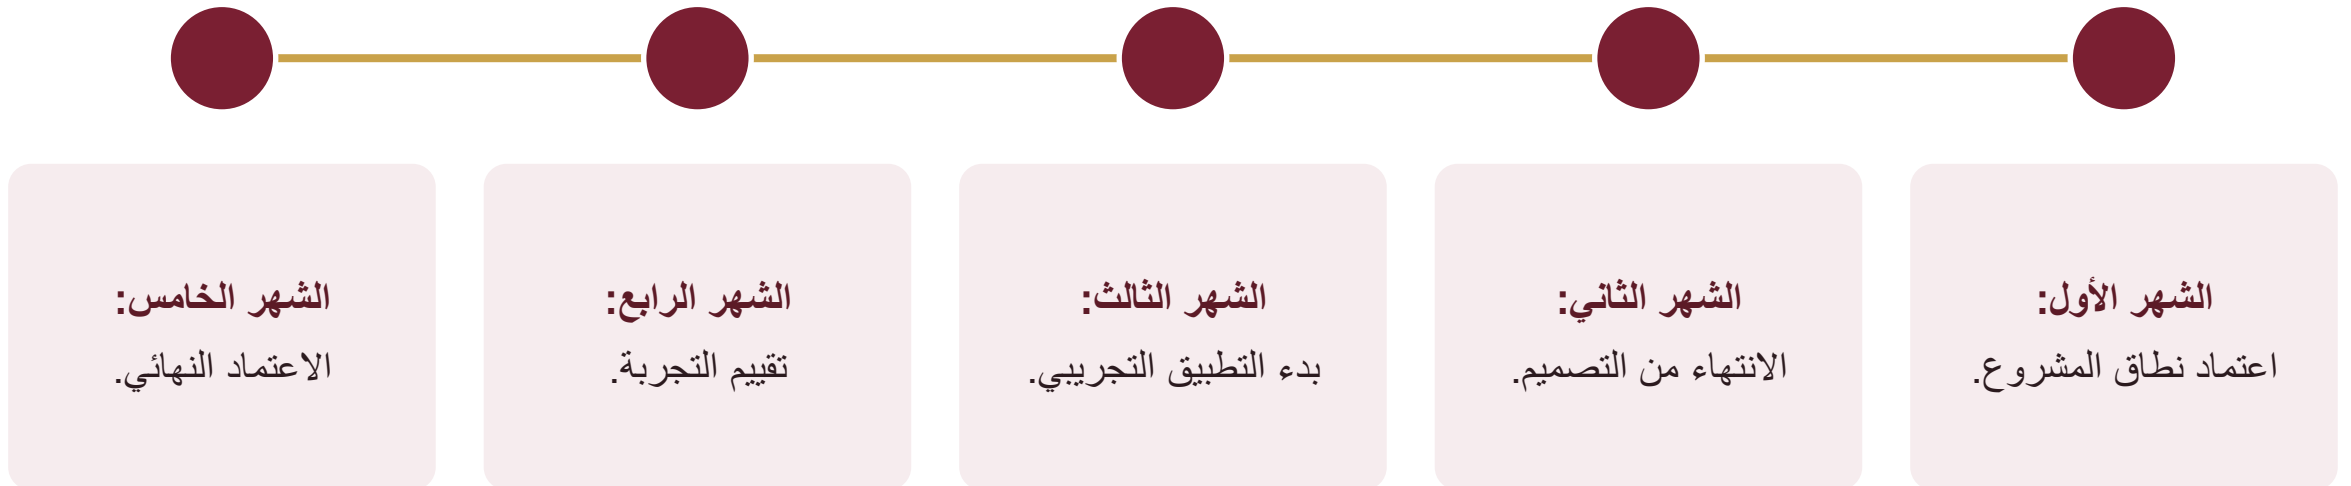

الموارد اللازمة للمشروع

قبل بدء المشروع يجب معرفة:

الجهات المرتبطة

هل يعتمد المشروع على
إدارة أو جهة أخرى؟

المتطلبات السابقة

ما الموافقات أو الأعمال
التي يجب أن تنتهي قبل
البدء؟

الموارد التقنية

هل نحتاج أنظمة أو أجهزة
أو برامج؟

الموارد المالية

كم تبلغ التكلفة وهل
الميزانية معتمدة؟

الموارد البشرية

من نحتاج لتنفيذ
المشروع؟

أخطاء شائعة في إدارة المشاريع التشغيلية

1 الهدف غير واضح.

2 المشروع لا يخدم هدفًا محددًا.

3 المشروع كبير جدًا ولا يتم تقسيمه إلى مهام.

4 تعدد المسؤولين عن نفس النتيجة.

5 عدم وضوح المخرجات.

6 غياب المواعيد.

7 عدم تحديد الموارد.

8 عدم معرفة الجهات المرتبطة بالمشروع.

المحور الثالث

مؤشرات الأداء

مؤشر الأداء هو مقياس رقمي يوضح مدى تقدم الجهة نحو تحقيق هدف محدد.

ويجيب عن سؤال:

هل نحن نحقق ما خططنا له؟

لماذا نستخدم مؤشرات الأداء؟

لأنها تساعدنا على:

1

تحويل الأهداف إلى
أرقام.

2

معرفة مستوى الإنجاز.

3

اكتشاف الانحرافات.

4

مقارنة النتائج
بالمستهدف.

5

دعم اتخاذ القرار.

مستويات القياس

الأثر

النتيجة الأوسع والأبعد.
مثال: تحسن جودة الخدمات المقدمة
للمستفيدين.

النتائج

التغيير الذي حدث بسبب المخرجات.
مثال: ارتفاع مستوى مهارات
الموظفين.

المخرجات

ما تم تنفيذه مباشرة.
مثال: تنفيذ 10 دورات تدريبية.

المدخلات

الموارد التي نستخدمها لتنفيذ العمل.
مثال: عدد الموظفين أو الميزانية
المخصصة للمشروع.

مؤشر المخرجات ومؤشر النتائج

خطأ شائع في الخطط هو قياس النشاط فقط.

مثال: عدد الدورات المنفذة.

هذا يخبرنا بما قمنا به، لكنه لا يخبرنا هل تغير الأداء.

الأفضل إضافة مؤشر نتيجة مثل:

نسبة تحسن أداء الموظفين بعد التدريب.

مؤشرات استباقية ومؤشرات متأخرة

مؤشرات متأخرة

تقيس النتيجة التي ظهرت بعد تنفيذ المشروع أو المهمة.

مثال: نسبة رضا المستفيدين.

مؤشرات استباقية

تقيس الأنشطة أو العوامل التي تسبق النتيجة.
وتساعد على التدخل مبكرًا.

مثال: نسبة الموظفين الذين أتموا التدريب.

الأفضل:

استخدام النوعين معًا.

شروط المؤشر الجيد

5

محدد بزمان

له فترة قياس واضحة.

4

مرتبط بالهدف

يقيس شيئاً يؤثر فعلياً في
تحقيق الهدف.

3

قابل للتحقيق

مناسب للإمكانات والموارد.

2

قابل للقياس

له رقم أو نسبة أو قيمة.

1

محدد

يعرف بالضبط ما الذي
نقيسه.

بطاقة المؤشر

بطاقة المؤشر توضح هوية المؤشر بالكامل.
وتشمل:

1 اسم المؤشر.

2 تعريف المؤشر.

3 معادلة الحساب.

4 خط الأساس.

5 المستهدف.

6 دورية القياس.

7 مصدر البيانات.

8 المسؤول عن البيانات.

مثال على بطاقة مؤشر

اسم المؤشر	نسبة الطلبات المقدمة إلكترونياً.
التعريف	عدد الطلبات الإلكترونية إلى إجمالي الطلبات.
المعادلة	$\frac{\text{الطلبات الإلكترونية}}{\text{إجمالي الطلبات}} \times 100$
خط الأساس	55%.
المستهدف	80%.
دورية القياس	شهرياً.
مصدر البيانات	نظام إدارة الطلبات.
المسؤول	مدير إدارة الخدمات.

خط الأساس والمستهدف

المستهدف

هو القيمة التي تريد الجهة الوصول إليها.

مثال:

الوصول إلى 85%.

خط الأساس

هو القيمة الحالية للمؤشر قبل بدء تنفيذ المشروع.


مثال:

نسبة رضا المستفيدين الحالية 70%.

المستهدفات المرحلية

بدل انتظار نهاية العام يمكن توزيع المستهدف على مراحل.

مثال:

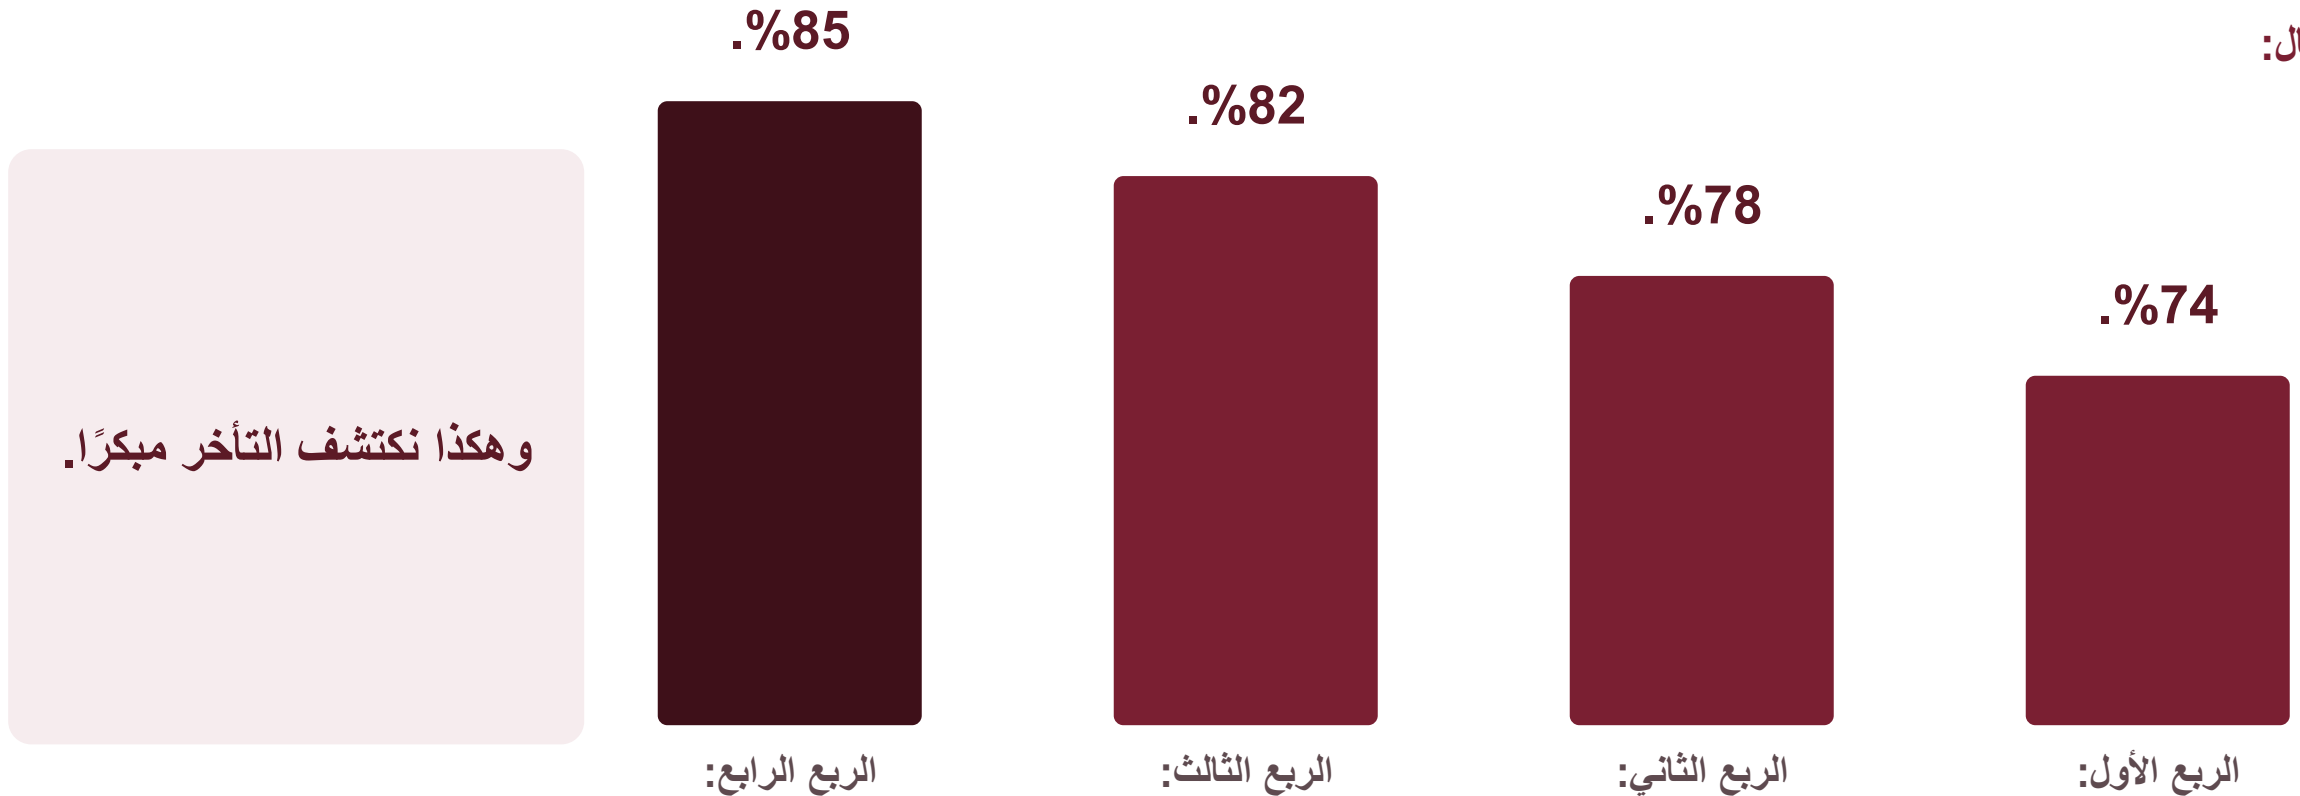

المحور الرابع

متابعة المشاريع والأداء

ما مصفوفة المتابعة؟

مصفوفة المتابعة هي أداة إدارية تجمع أهم بيانات تنفيذ المشاريع والمهام في جدول واحد.

وتساعد المدير على معرفة:

ما الذي يحتاج إلى
قرار؟

ما المشاريع المتعثرة؟

ما نسبة الإنجاز؟

من المسؤول؟

ما المشروع الجاري
تنفيذه؟

أعمدة مصفوفة المتابعة

5

المستهدف

ما القيمة المطلوبة؟

4

مؤشر الأداء

كيف نقيس التقدم؟

3

المسؤول المعتمد

من يتحمل المسؤولية النهائية؟

2

مسؤول التنفيذ

من يقوم بالتنفيذ؟

1

المشروع أو المهمة

ما الذي نتابعه؟

10

الإجراء التصحيحي

ماذا سنفعل لمعالجة التعثر؟

9

المعوقات

ما الذي يؤخر التنفيذ؟

8

الحالة

هل المشروع على المسار أم
يحتاج متابعة أم متعثر؟

7

نسبة الإنجاز

كم تحقق من المستهدف؟

6

المنجز

ما القيمة التي تحققت؟

حساب نسبة الإنجاز

في المؤشرات التي كلما زادت كان الأداء أفضل:

$$\text{نسبة الإنجاز} = \frac{\text{المنجز}}{\text{المستهدف}} \times 100$$

مثال:

نسبة الإنجاز:

$$90\% = 100 \times 80 \div 72$$

المنجز:

72%

المستهدف:

80%

مؤشرات كلما قل كانت أفضل

هناك مؤشرات يكون التحسن فيها بالانخفاض.

مثل:

● زمن الانتظار.

● عدد الشكاوى.

● زمن إنجاز المعاملة.

هنا نحتاج إلى معرفة:

1 ● خط الأساس.

2 ● المستهدف.

3 ● والمنجز الحالي.

المنجز الحالي:

4 أيام.

المستهدف:

3 أيام.

خط الأساس:

5 أيام.

تم تقليل يوم واحد من أصل يومين مطلوبين.

إذن تحقق:

50% من التحسن المطلوب.

متعثر

أقل من 70%.

يحتاج إلى تدخل إداري أو تصعيد أو قرار.

يحتاج متابعة

من 70% إلى أقل من 90%.

يحتاج إلى تحديد سبب الفجوة واتخاذ إجراء
تصحيحي.

على المسار

90% فأكثر.

يعني أن المشروع يسير قريباً من
المستهدف.

ملاحظة: يمكن للجهة تعديل هذه النسب وفق نظامها الداخلي.

لوحة متابعة المشاريع

لوحة المتابعة تعرض أهم معلومات المشاريع في صفحة واحدة.
وقد تتضمن:

عدد المشاريع التي تحتاج
متابعة.

عدد المشاريع على المسار.

عدد المشاريع المكتملة.

متوسط الإنجاز العام.

القرارات المطلوبة.

أهم المخاطر.

عدد المشاريع المتعثرة.

اجتماع متابعة المشاريع

اجتماع المتابعة يجب أن يكون اجتماع قرار، وليس اجتماع عرض معلومات فقط.

ويركز على:

رابعًا: الخطوات القادمة

من المسؤول؟
وما الموعد؟

ثالثًا: القرار المطلوب

ما الإجراء المطلوب لمعالجة
الوضع؟

ثانيًا: أسباب التعثر

ما السبب الحقيقي للمشكلة؟

أولًا: المشاريع التي تحتاج متابعة

نبدأ بالمشاريع المتأخرة أو
المتعثرة.

المحور الخامس

التقارير والمخاطر والتصعيد

تقرير الأداء الدوري

التقرير الجيد يجب أن يكون مختصرًا ويركز على ما يحتاجه متخذ القرار.

مكونات التقرير الدوري

1. الملخص التنفيذي

يعرض الصورة العامة في عدة أسطر.

2. الإنجاز مقابل المستهدف

يعرض أهم الأرقام والنسب.

3. حالة المشاريع

يوضح المشاريع المكتملة والمستمرة والمتعثرة.

4. المعوقات والمخاطر

يوضح ما يؤثر في التنفيذ.

5. القرارات المطلوبة

يحدد ما يحتاج إلى اعتماد أو تدخل.

6. الخطوات القادمة

يوضح ما سيتم تنفيذه بعد ذلك.

كيف نكتب الملخص التنفيذي؟

الملخص التنفيذي الجيد يجب أن:

1

أين وصلنا؟

2

ما المشاريع التي تسير
جيداً؟

3

ما المشاريع المتعثرة؟

4

لماذا تعثرت؟

5

وما القرار المطلوب؟

مثال على ملخص تنفيذي

بلغ متوسط إنجاز المشاريع التشغيلية 82% بنهاية الربع الثاني. يسير مشروع التحول الإلكتروني ومشروع تطوير الخدمات وفق المستهدف. في المقابل تعثر مشروع تطوير نظام الانتظار بسبب تأخر توريد الأجهزة. يتطلب استكمال المشروع اعتماد مورد بديل خلال الفترة القادمة.

كيف نعرض على القيادة؟

1 ابدأ بالخلاصة.

2 اعرض نسبة الإنجاز بجانب المستهدف.

3 ركز على المشاريع التي تحتاج إلى قرار.

4 وضح سبب التعثر.

5 اقترح الإجراء.

6 حدد القرار المطلوب.

وتجنب إغراق التقرير بالتفاصيل التشغيلية.

القاعدة:

القائد يقرأ ليقرر.

الفرق بين الخطر والمعوق

المعوق

مشكلة حدثت بالفعل وأثرت في المشروع.

مثال:

تأخر المورد شهرين عن الموعد.

الخطر

حدث محتمل لم يقع بعد ولكنه قد يؤثر في المشروع.

مثال:

احتمال تأخر المورد.

تقييم المخاطر

يتم تقييم الخطر بناء على عنصرين:

الأثر

ما حجم تأثيره على المشروع إذا وقع؟

الاحتمالية

ما احتمال وقوعه؟

وبناء عليه يصنف إلى:

مرتفع.

متوسط.

منخفض.

التعامل مع المخاطر

3

خطر مرتفع

إعداد خطة استجابة واضحة ومتابعة
مباشرة.

2

خطر متوسط

وضع إجراء لتقليل الاحتمالية أو الأثر.

1

خطر منخفض

المتابعة والتوثيق.

التصعيد الإداري

التصعيد يتم عندما يتجاوز حل المشكلة صلاحية المستوى الحالي.

المستوى الرابع

المدير العام أو الرئيس التنفيذي أو
الإدارة العليا.
يتخذ القرار الذي يتجاوز صلاحيات
المستويات السابقة.

المستوى الثالث

مدير الدائرة أو الإدارة.
يعيد ترتيب الموارد والأولويات.

المستوى الثاني

رئيس القسم.
يعالج العوائق التي تحتاج إلى تنسيق أو
صلاحية أعلى.

المستوى الأول

مسؤول التنفيذ.
يحاول معالجة المشكلة ضمن نطاق
عمله.

رسالة التصعيد الجيدة

يجب أن تجيب عن خمسة أسئلة:

5

متى نحتاج إلى القرار؟

4

ما القرار المطلوب؟

3

ما الذي تم اتخاذه حتى
الآن؟

2

ما أثرها على المشروع
والهدف؟

1


ما المشكلة؟

الموضوع: طلب اعتماد مورد بديل لمشروع نظام الانتظار

تأخر المورد الحالي في توريد الأجهزة لمدة ثمانية أسابيع، مما أثر في تنفيذ مشروع خفض زمن انتظار المستفيدين. تم التواصل معه عدة مرات دون الحصول على موعد مؤكد للتوريد. نقترح اعتماد المورد البديل المؤهل ضمن الميزانية المعتمدة. نحتاج إلى القرار قبل نهاية الأسبوع حتى لا يمتد أثر التأخير إلى الربع القادم.

الخلاصة النهائية

التخطيط التشغيلي الناجح يعتمد على سلسلة واضحة:

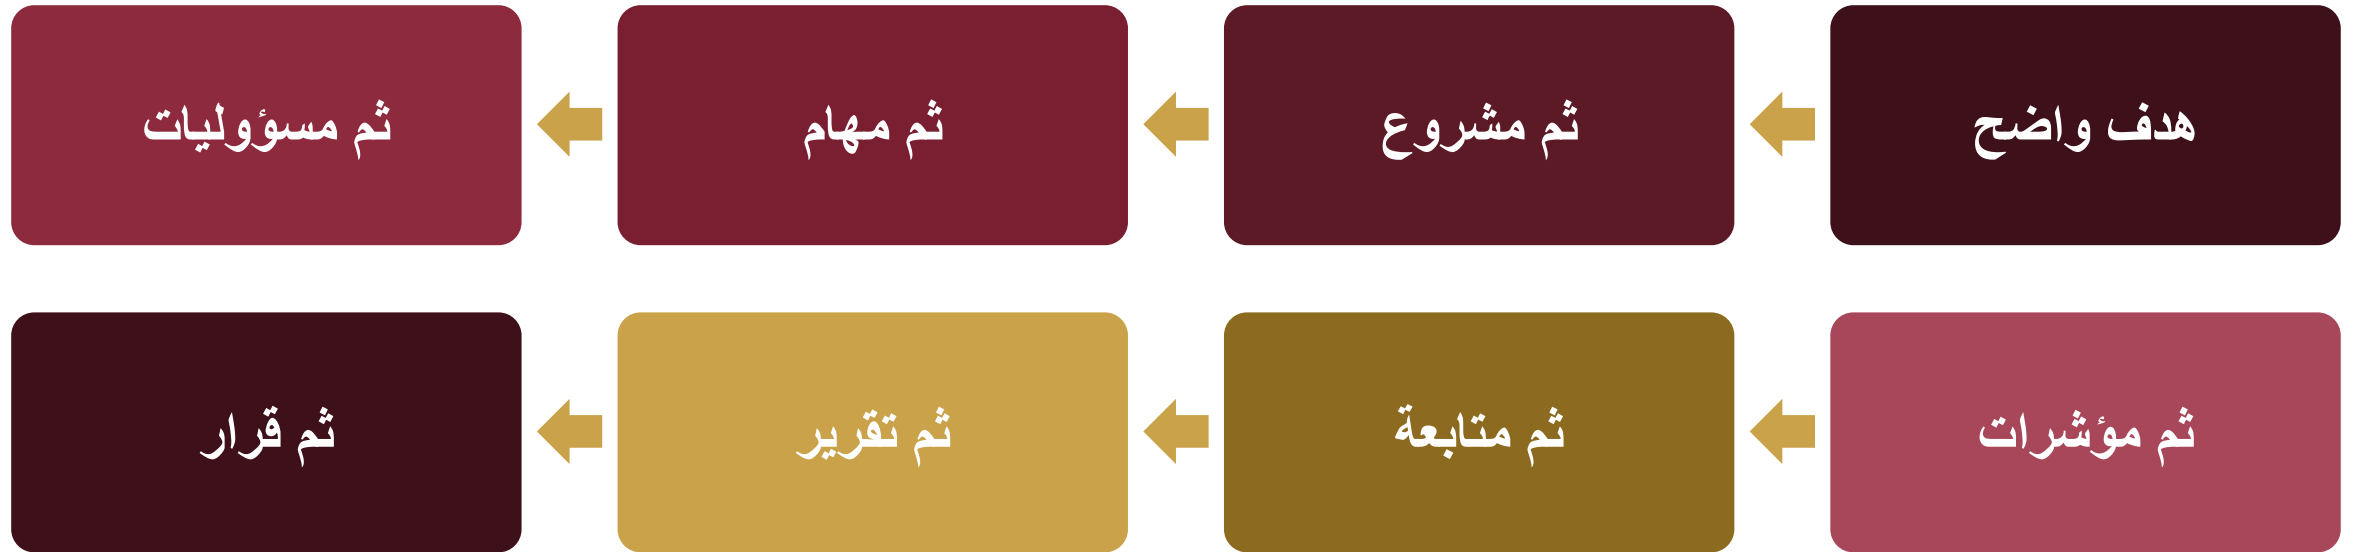

وإذا انقطعت أي حلقة من هذه السلسلة يتعثر التنفيذ.

الرسالة الختامية

الخطـة ليست ملفاً نحفظه.
الخطـة هي:

موعد محدد.

هدف نعرف لماذا نريد تحقيقه.

رقم نقيسه.

مشروع يترجم الهدف إلى عمل.

اجتماع نراجع فيه.

مهام واضحة.

وقرار نصح به المسار.

مسؤول يعرف ما عليه.

ومن هنا تنتقل الجهة من التخطيط إلى التنفيذ
ومن التنفيذ إلى الأثر.

المدرّب
عمر بن راشد الشعيبي
