معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

التخطيط التشغيلي ومتابعة الأداء

من الخطة إلى التنفيذ

المدرب: عمر بن راشد الشعيبي

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

مقدمة الدورة

التخطيط التشغيلي هو الحلقة التي تربط بين التوجه الاستراتيجي والعمل اليومي داخل الجهة.

فوجود خطة استراتيجية وحده لا يكفي، لأن النجاح الحقيقي يبدأ عندما تتحول الأهداف العامة إلى:

1. مشاريع واضحة
2. مهام محددة
3. مسؤوليات معروفة
4. جداول زمنية
5. مؤشرات أداء
6. ومتابعة دورية

الرسالة الأساسية للدورة:

الخطة الناجحة ليست التي تكتب بصورة جيدة فقط، بل التي يمكن تنفيذها وقياسها ومتابعتها وتحويلها إلى نتائج.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-IHSSAN TRAINING INSTITUTE

أهداف الدورة

بنهاية الدورة يكون المشارك قادرًا على:

1. التمييز بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية.
2. تحويل الأهداف العامة إلى أهداف تشغيلية قابلة للتنفيذ.
3. تحويل الأهداف التشغيلية إلى مشاريع ومهام واضحة.
4. تحديد المسؤوليات الإدارية عن التنفيذ والمتابعة والاعتماد.
5. صياغة مؤشرات أداء قابلة للقياس.
6. بناء مصفوفة لمتابعة الأداء.
7. قراءة نسب الإنجاز وحالات التعثر.
8. إعداد تقرير أداء مختصر يدعم اتخاذ القرار.
9. التعامل مع المخاطر والتصعيد الإداري عند الحاجة.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSAN TRAINING INSTITUTE

المحور الأول

أساسيات التخطيط التشغيلي

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

ما التخطيط التشغيلي؟

التخطيط التشغيلي هو تحويل الأهداف والتوجهات الاستراتيجية إلى أعمال محددة قابلة للتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة، عادة لا تتجاوز سنة.

ويجيب عن أسئلة واضحة:

ماذا سننجز؟	كيف سننجزه؟	من المسؤول؟	متى يبدأ ومتى ينتهي؟	كيف سنعرف أننا نجحنا؟

مثال:

إذا كان الهدف الاستراتيجي هو تحسين تجربة المستفيدين، فقد تتضمن الخطة التشغيلية مشروعًا لتطوير نظام المواعيد، ومشروعًا لتطوير الخدمات الإلكترونية، ومشروعًا لتأهيل موظفي الاستقبال.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

لماذا نحتاج إلى التخطيط التشغيلي؟

لأن الأهداف العامة لا تتحقق تلقائيًا.

التخطيط التشغيلي يساعد على:

1. تحويل التوجهات إلى أعمال فعلية.
2. تحديد الأولويات.
3. تنظيم المشاريع والمهام.
4. توزيع المسؤوليات.
5. تنظيم الوقت والموارد.
6. متابعة التنفيذ.
7. اكتشاف التعثر مبكرًا.
8. اتخاذ قرارات مبنية على بيانات.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

لماذا تتعثر الخطط؟

1. خطة بلا مشاريع ومهام

المعنى:
توجد أهداف مكتوبة، ولكن لم يتم تحويلها إلى أعمال محددة قابلة للتنفيذ.

مثال:
نكتب في الخطة:
تحسين جودة الخدمات.
ولكن لا نحدد ما المشاريع التي ستنفذ لتحقيق هذا الهدف.

2. مشاريع ومهام بلا مسؤول

المعنى:
توجد أعمال واضحة، ولكن لا يوجد شخص أو إدارة محددة تتحمل مسؤولية تنفيذها.

مثال:
مشروع تحديث دليل الإجراءات، دون تحديد الإدارة المسؤولة عن التنفيذ والاعتماد.

3. مسؤول بلا متابعة

المعنى:
تم تحديد المسؤول، ولكن لا توجد مؤشرات أو اجتماعات متابعة أو تقارير دورية.

النتيجة:
قد نكتشف التأخر في نهاية الفترة بدل اكتشافه أثناء التنفيذ.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

رحلة الخطة من الاستراتيجية إلى التنفيذ

تمر الخطة بعدة مراحل مترابطة:

1. الخطة الاستراتيجية	تحدد الاتجاه العام والأهداف بعيدة المدى. **السؤال:** أين نريد أن نصل؟
2. الخطة التشغيلية	تحدد ما الذي سننفذه خلال السنة لتحقيق تلك الأهداف. **السؤال:** ماذا سنفعل خلال هذه السنة؟
3. المشاريع	تحول الهدف التشغيلي إلى أعمال رئيسية منظمة يمكن إدارتها ومتابعتها.
4. المهام	هي الأعمال التفصيلية التي يجب تنفيذها لإنجاز المشروع.
5. مؤشرات الأداء	تقيس مدى التقدم والإنجاز.
6. المتابعة	تقارن بين المنجز والمستهدف.
7. التقرير	يعرض الوضع لمتخذ القرار ويحدد ما يحتاج إلى تدخل أو اعتماد.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

الفرق بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية

الخطة الاستراتيجية	الخطة التشغيلية
الأفق الزمني: غالبًا من 3 إلى 5 سنوات.	الأفق الزمني: سنة أو أقل.
تركز على الاتجاه العام.	تركز على التنفيذ.
تتضمن أهدافًا وتوجهات كبرى.	تتضمن أهدافًا تشغيلية ومشاريع ومهام ومؤشرات.
تقودها الإدارة العليا.	تنفذها الإدارات والأقسام وفرق العمل.
مثال: رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.	**مثال:** خفض متوسط زمن الانتظار من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة بنهاية العام.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

مكونات الخطة التشغيلية

1 الهدف

النتيجة التي نريد الوصول إليها.

2 المشروع

مجموعة من الأعمال والمهام المترابطة التي تنفذ خلال فترة زمنية محددة لتحقيق هدف أو نتيجة واضحة.

مثال: مشروع تطوير نظام المواعيد المسبقة.

3 المهمة

عمل محدد داخل المشروع له بداية ونهاية ومسؤول واضح.

مثال: إعداد نموذج الحجز الإلكتروني.

4 مسؤول التنفيذ

الشخص أو الفريق الذي ينفذ المهمة فعليًا.

5 المسؤول المعتمد

الشخص الذي يتحمل المسؤولية النهائية عن النتيجة ويعتمدها.

6 الجدول الزمني

يحدد مواعيد البداية والنهاية ونقاط التحقق أثناء التنفيذ.

7 مؤشر الأداء

يحدد كيف نقيس التقدم أو النتيجة.

8 المستهدف

القيمة التي نريد الوصول إليها.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

دورة التخطيط والمتابعة



الخلاصة:

التخطيط ليس وثيقة ثابتة، بل دورة مستمرة من التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتحسين.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

ترتيب الأولويات

يمكن تصنيف الأعمال وفق الأهمية والإلحاح:

مهم وعاجل

يحتاج إلى التنفيذ فورًا.

مثال: تعطل نظام استقبال المراجعين.

مهم وغير عاجل

يحتاج إلى تخطيط وتخصيص وقت.

مثال: إعداد مشروع لتطوير الإجراءات أو مشروع لتأهيل الموظفين.

وهذه الفئة هي التي تصنع التحسين المستقبلي.

عاجل وغير مهم

يمكن تفويضه إلى شخص آخر.

غير مهم وغير عاجل

يمكن تأجيله أو حذفه إذا لم يخدم أهداف الجهة.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSAN TRAINING INSTITUTE

المحور الثاني

تحويل الأهداف إلى مشاريع ومهام

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

صياغة الهدف التشغيلي

الهدف التشغيلي الجيد يجب أن يوضح أربعة عناصر:

1. الفعل	2. الموضوع	3. مقدار التغيير	4. الإطار الزمني
رفع خفض زيادة تقليص إطلاق استكمال اعتماد	ما الذي سنغيره؟	كم نريد أن نحقق؟	متى نريد تحقيقه؟

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

مثال على هدف تشغيلي واضح

بدل أن نقول:

تحسين رضا المستفيدين

نقول:

رفع نسبة رضا المستفيدين من 70% إلى 85% بنهاية الربع الرابع.

هنا أصبح الهدف واضحًا وقابلًا للقياس والمتابعة.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

من الهدف إلى المشروع إلى المهمة

الهدف

هو النتيجة التي نريد الوصول إليها.

مثال: خفض متوسط زمن الانتظار من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة.

المشروع

هو عمل رئيسي منظم يساهم في تحقيق الهدف ويضم عددًا من المهام.

مثال: مشروع تطوير نظام المواعيد المسبقة.

المهمة

هي عمل محدد داخل المشروع يمكن إسناده وإنهاؤه.

مثال: إعداد نموذج الحجز الإلكتروني.

معهد رواد الإحسان للتدريب
ROWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

الفرق بين المشروع والمهمة

المشروع	المهمة
أكبر وأشمل.	أصغر وأكثر تحديدًا.
يضم عدة مهام.	تنفذ كجزء من المشروع.
له هدف أو نتيجة واضحة.	لها بداية ونهاية واضحة.
له مدة زمنية محددة.	لها مسؤول تنفيذ.
قد يشترك في تنفيذه أكثر من قسم.	ينتج عنها مخرج محدد.
له مسؤول عن المشروع.	

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

مثال

المشروع:
تطوير نظام استقبال المستفيدين.

المهام:

1. إعداد المتطلبات.
2. شراء أجهزة تنظيم الدور.
3. تركيب الشاشات.
4. تهيئة النظام.
5. تدريب الموظفين.
6. إطلاق النظام.

معهد رواد الإحسان للتدريب
ROWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

هيكل المشروع والمهام

المشروع

أتمتة طلبات المستفيدين.

المهام	المخرجات
تصميم النموذج الإلكتروني.	نموذج إلكتروني معتمد.
ربط النموذج بالنظام.	ربط ناجح.
اختبار الخدمة.	تقرير اختبار.
تدريب الموظفين.	موظفون مدربون.
إطلاق الخدمة.	خدمة عاملة.

القاعدة:

كل مهمة يجب أن يكون لها مخرج واضح يثبت أنها انتهت.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

إسناد المسؤوليات

وضوح المسؤوليات يمنع تداخل الأدوار ويجعل المتابعة والمساءلة أكثر فاعلية.

يمكن توزيع الأدوار كالتالي:

مسؤول التنفيذ

الموظف أو الفريق الذي يقوم بتنفيذ المهمة فعليًا.

مثال:

أخصائي التدريب والتطوير يعد خطة التدريب.

المسؤول المعتمد

الشخص الذي يعتمد النتيجة ويتحمل المسؤولية الإدارية النهائية عنها.

مثال:

مدير دائرة الموارد البشرية.

يفضل أن يكون لكل مهمة مسؤول معتمد واحد فقط.

الجهة الاستشارية

الجهة التي نحتاج إلى رأيها قبل اتخاذ القرار أو استكمال المهمة.

مثال:

الدائرة القانونية.

دائرة تقنية المعلومات.

الدائرة المالية.

بحسب طبيعة المشروع.

الجهة المطلعة

الجهة التي يجب إبلاغها بمستوى التقدم دون أن تشارك مباشرة في التنفيذ.

مثال:

المدير العام.

مكتب الرئيس التنفيذي.

رئيس القطاع.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

مثال متكامل لإسناد المسؤوليات

المشروع	تطوير دليل إجراءات خدمة المستفيدين.
المهمة	إعداد النسخة المحدثة من الدليل.
مسؤول التنفيذ	أخصائي الجودة والتطوير المؤسسي.
المسؤول المعتمد	مدير دائرة خدمات المستفيدين.
الجهة الاستشارية	الدائرة القانونية ودائرة تقنية المعلومات.
الجهة المطلعة	المدير العام.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

المعالم الزمنية للمشروع

الموعد النهائي وحده لا يكفي.

يجب تقسيم المشروع إلى مراحل تساعدنا على اكتشاف التأخر مبكرًا.

مثال:



الشهر الأول:
اعتماد نطاق المشروع.

الشهر الثاني:
الانتهاء من التصميم.

الشهر الثالث:
بدء التطبيق التجريبي.

الشهر الرابع:
تقييم التجربة.

الشهر الخامس:
الاعتماد النهائي.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

الموارد اللازمة للمشروع

قبل بدء المشروع يجب معرفة:

الموارد البشرية	الموارد المالية	الموارد التقنية	المتطلبات السابقة	الجهات المرتبطة
من نحتاج لتنفيذ المشروع؟	كم تبلغ التكلفة وهل الميزانية معتمدة؟	هل نحتاج أنظمة أو أجهزة أو برامج؟	ما الموافقات أو الأعمال التي يجب أن تنتهي قبل البدء؟	هل يعتمد المشروع على إدارة أو جهة أخرى؟

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

أخطاء شائعة في إدارة المشاريع التشغيلية

1. الهدف غير واضح.
2. المشروع لا يخدم هدفًا محددًا.
3. المشروع كبير جدًا ولا يتم تقسيمه إلى مهام.
4. تعدد المسؤولين عن نفس النتيجة.
5. عدم وضوح المخرجات.
6. غياب المواعيد.
7. عدم تحديد الموارد.
8. عدم معرفة الجهات المرتبطة بالمشروع.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

المحور الثالث

مؤشرات الأداء

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

ما مؤشر الأداء؟

مؤشر الأداء هو مقياس رقمي يوضح مدى تقدم الجهة نحو تحقيق هدف محدد.

ويجيب عن سؤال:

هل نحن نحقق ما خططنا له؟

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-IHSSAN TRAINING INSTITUTE

لماذا نستخدم مؤشرات الأداء؟

لأنها تساعدنا على:

1. تحويل الأهداف إلى أرقام.
2. معرفة مستوى الإنجاز.
3. اكتشاف الانحرافات.
4. مقارنة النتائج بالمستهدف.
5. دعم اتخاذ القرار.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

مستويات القياس

المدخلات

الموارد التي نستخدمها لتنفيذ العمل.

مثال: عدد الموظفين أو الميزانية المخصصة للمشروع.

المخرجات

ما تم تنفيذه مباشرة.

مثال: تنفيذ 10 دورات تدريبية.

النتائج

التغيير الذي حدث بسبب المخرجات.

مثال: ارتفاع مستوى مهارات الموظفين.

الأثر

النتيجة الأوسع والأبعد.

مثال: تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

مؤشر المخرجات ومؤشر النتائج

خطأ شائع في الخطط هو قياس النشاط فقط.

مثال: عدد الدورات المنفذة.

هذا يخبرنا بما قمنا به، لكنه لا يخبرنا هل تغير الأداء.

الأفضل إضافة مؤشر نتيجة مثل:

نسبة تحسن أداء الموظفين بعد التدريب.

مؤشرات استباقية ومؤشرات متأخرة

مؤشرات استباقية	مؤشرات متأخرة
تقيس الأنشطة أو العوامل التي تسبق النتيجة. وتساعد على التدخل مبكرًا.	تقيس النتيجة التي ظهرت بعد تنفيذ المشروع أو المهمة.
مثال: نسبة الموظفين الذين أتموا التدريب.	**مثال:** نسبة رضا المستفيدين.

الأفضل:

استخدام النوعين معًا.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

شروط المؤشر الجيد

1	2	3	4	5
محدد	قابل للقياس	قابل للتحقيق	مرتبط بالهدف	محدد بزمن
يعرف بالضبط ما الذي نقيسه.	له رقم أو نسبة أو قيمة.	مناسب للإمكانات والموارد.	يقيس شيئًا يؤثر فعليًا في تحقيق الهدف.	له فترة قياس واضحة.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

بطاقة المؤشر

بطاقة المؤشر توضح هوية المؤشر بالكامل.

وتشمل:

1. اسم المؤشر.
2. تعريف المؤشر.
3. معادلة الحساب.
4. خط الأساس.
5. المستهدف.
6. دورية القياس.
7. مصدر البيانات.
8. المسؤول عن البيانات.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

مثال على بطاقة مؤشر

اسم المؤشر	نسبة الطلبات المقدمة إلكترونيًا.
التعريف	عدد الطلبات الإلكترونية إلى إجمالي الطلبات.
المعادلة	الطلبات الإلكترونية ÷ إجمالي الطلبات × 100.
خط الأساس	55%.
المستهدف	80%.
دورية القياس	شهريًا.
مصدر البيانات	نظام إدارة الطلبات.
المسؤول	مدير إدارة الخدمات.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

خط الأساس والمستهدف

خط الأساس

هو القيمة الحالية للمؤشر قبل بدء تنفيذ المشروع.

مثال:

نسبة رضا المستفيدين الحالية 70%.

المستهدف

هو القيمة التي تريد الجهة الوصول إليها.

مثال:


الوصول إلى 85%.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

المستهدفات المرحلية

بدل انتظار نهاية العام يمكن توزيع المستهدف على مراحل.

مثال:

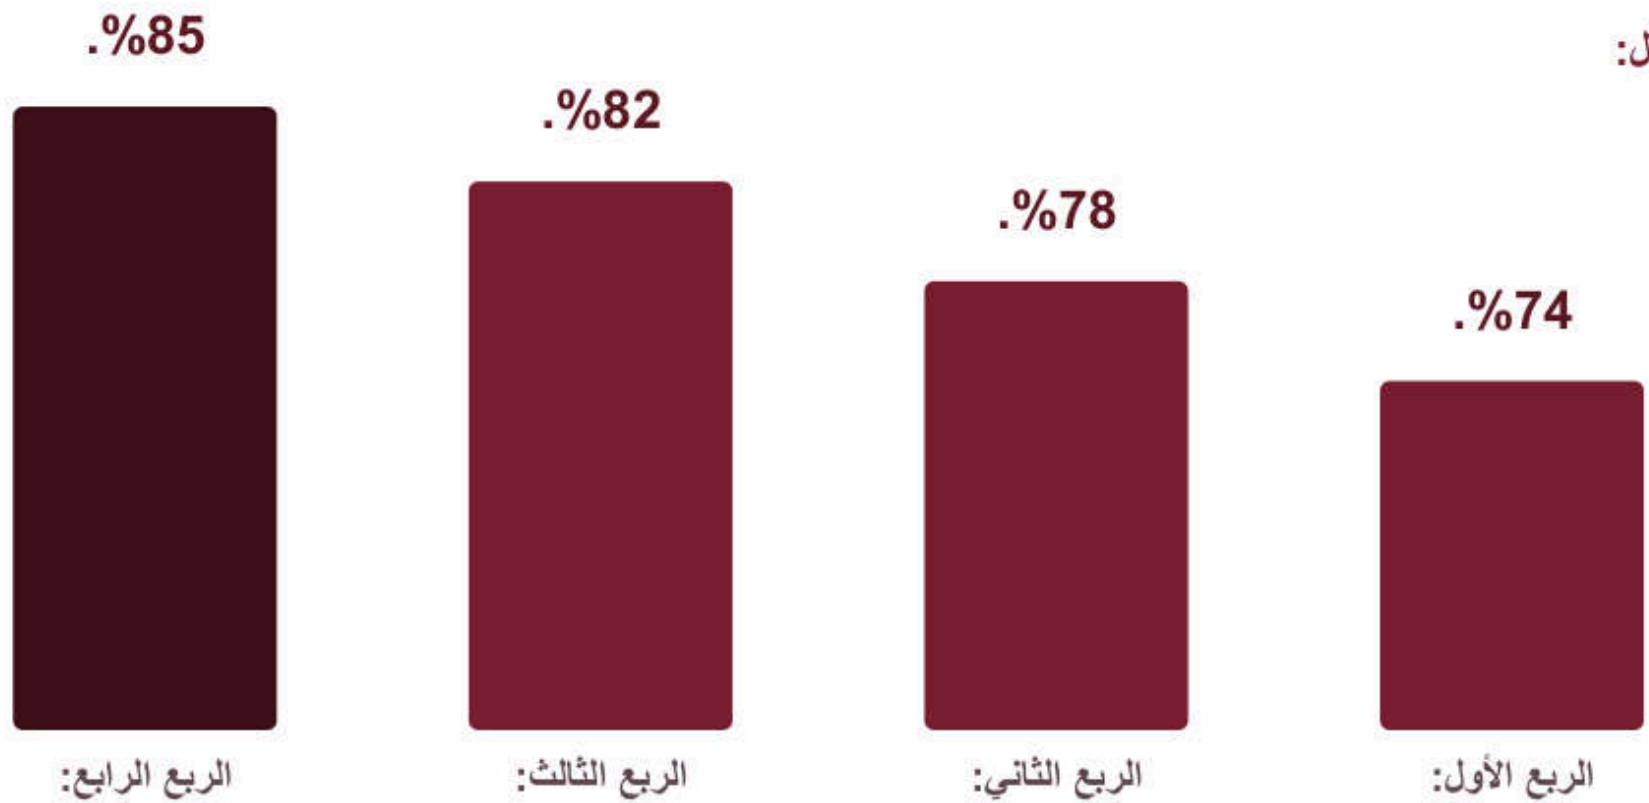

وهكذا نكتشف التأخر مبكرًا.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

المحور الرابع

متابعة المشاريع والأداء

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

ما مصفوفة المتابعة؟

مصفوفة المتابعة هي أداة إدارية تجمع أهم بيانات تنفيذ المشاريع والمهام في جدول واحد.

وتساعد المدير على معرفة:

- ما المشروع الجاري تنفيذه؟
- من المسؤول؟
- ما نسبة الإنجاز؟
- ما المشاريع المتعثرة؟
- ما الذي يحتاج إلى قرار؟

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

أعمدة مصفوفة المتابعة

1
المشروع أو المهمة
ما الذي نتابعه؟

2
مسؤول التنفيذ
من يقوم بالتنفيذ؟

3
المسؤول المعتمد
من يتحمل المسؤولية النهائية؟

4
مؤشر الأداء
كيف نقيس التقدم؟

5
المستهدف
ما القيمة المطلوبة؟

6
المنجز
ما القيمة التي تحققت؟

7
نسبة الإنجاز
كم تحقق من المستهدف؟

8
الحالة
هل المشروع على المسار أم يحتاج متابعة أم متعثر؟

9
المعوقات
ما الذي يؤخر التنفيذ؟

10
الإجراء التصحيحي
ماذا سنفعل لمعالجة التعثر؟

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-IHSSAN TRAINING INSTITUTE

حساب نسبة الإنجاز

في المؤشرات التي كلما زادت كان الأداء أفضل:

نسبة الإنجاز = المنجز ÷ المستهدف × 100

مثال:

المستهدف:	المنجز:	نسبة الإنجاز:
.%80	.%72	.%90 = 100 × 80 ÷ 72

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

مؤشرات كلما قل كانت أفضل

هناك مؤشرات يكون التحسن فيها بالانخفاض.

مثل:

- زمن الانتظار.
- عدد الشكاوى.
- زمن إنجاز المعاملة.

هنا نحتاج إلى معرفة:

1. خط الأساس.
2. المستهدف.
3. والمنجز الحالي.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

مثال

خط الأساس:	المستهدف:	المنجز الحالي:
5 أيام.	**3 أيام.**	**4 أيام.**

تم تقليل يوم واحد من أصل يومين مطلوبين.

إذن تحقق:

50% من التحسن المطلوب.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

حالات الأداء

على المسار

90% فأكثر.

يعني أن المشروع يسير قريبًا من المستهدف.

يحتاج متابعة

من 70% إلى أقل من 90%.

يحتاج إلى تحديد سبب الفجوة واتخاذ إجراء تصحيحي.

متعثر

أقل من 70%.

يحتاج إلى تدخل إداري أو تصعيد أو قرار.

ملاحظة: يمكن للجهة تعديل هذه النسب وفق نظامها الداخلي.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

لوحة متابعة المشاريع

لوحة المتابعة تعرض أهم معلومات المشاريع في صفحة واحدة.

وقد تتضمن:

- متوسط الإنجاز العام.
- عدد المشاريع المكتملة.
- عدد المشاريع على المسار.
- عدد المشاريع التي تحتاج متابعة.
- عدد المشاريع المتعثرة.
- أهم المخاطر.
- القرارات المطلوبة.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

اجتماع متابعة المشاريع

اجتماع المتابعة يجب أن يكون اجتماع قرار، وليس اجتماع عرض معلومات فقط.

ويركز على:

أولًا: المشاريع التي تحتاج متابعة	ثانيًا: أسباب التعثر	ثالثًا: القرار المطلوب	رابعًا: الخطوات القادمة
نبدأ بالمشاريع المتأخرة أو المتعثرة.	ما السبب الحقيقي للمشكلة؟	ما الإجراء المطلوب لمعالجة الوضع؟	من المسؤول؟ وما الموعد؟

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

المحور الخامس

التقارير والمخاطر والتصعيد

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

تقرير الأداء الدوري

التقرير الجيد يجب أن يكون مختصرًا ويركز على ما يحتاجه متخذ القرار.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

مكونات التقرير الدوري

1. الملخص التنفيذي	يعرض الصورة العامة في عدة أسطر.
2. الإنجاز مقابل المستهدف	يعرض أهم الأرقام والنسب.
3. حالة المشاريع	يوضح المشاريع المكتملة والمستمرة والمتعثرة.
4. المعوقات والمخاطر	يوضح ما يؤثر في التنفيذ.
5. القرارات المطلوبة	يحدد ما يحتاج إلى اعتماد أو تدخل.
6. الخطوات القادمة	يوضح ما سيتم تنفيذه بعد ذلك.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

كيف نكتب الملخص التنفيذي؟

الملخص التنفيذي الجيد يجيب عن:

1. أين وصلنا؟
2. ما المشاريع التي تسير جيدًا؟
3. ما المشاريع المتعثرة؟
4. لماذا تعثرت؟
5. وما القرار المطلوب؟

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

مثال على ملخص تنفيذي

بلغ متوسط إنجاز المشاريع التشغيلية 82% بنهاية الربع الثاني.
يسير مشروع التحول الإلكتروني ومشروع تطوير الخدمات وفق المستهدف.
في المقابل تعثر مشروع تطوير نظام الانتظار بسبب تأخر توريد الأجهزة.
يتطلب استكمال المشروع اعتماد مورد بديل خلال الفترة القادمة.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

كيف نعرض على القيادة؟

1. ابدأ بالخلاصة.
2. اعرض نسبة الإنجاز بجانب المستهدف.
3. ركز على المشاريع التي تحتاج إلى قرار.
4. وضح سبب التعثر.
5. اقترح الإجراء.
6. حدد القرار المطلوب.

وتجنب إغراق التقرير بالتفاصيل التشغيلية.

القاعدة:

القائد يقرأ ليقرر.

الفرق بين الخطر والمعوق

الخطر

حدث محتمل لم يقع بعد ولكنه قد يؤثر في المشروع.

مثال:

احتمال تأخر المورد.

المعوق

مشكلة حدثت بالفعل وأثرت في المشروع.

مثال:

تأخر المورد شهرين عن الموعد.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

تقييم المخاطر

يتم تقييم الخطر بناء على عنصرين:

الاحتمالية	الأثر
ما احتمال وقوعه؟	ما حجم تأثيره على المشروع إذا وقع؟

وبناء عليه يصنف إلى:

منخفض.	متوسط.	مرتفع.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

التعامل مع المخاطر

1

خطر منخفض

المتابعة والتوثيق.

2

خطر متوسط

وضع إجراء لتقليل الاحتمالية أو الأثر.

3

خطر مرتفع

إعداد خطة استجابة واضحة ومتابعة مباشرة.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-IHSSAN TRAINING INSTITUTE

التصعيد الإداري

التصعيد يتم عندما يتجاوز حل المشكلة صلاحية المستوى الحالي.

المستوى الأول

مسؤول التنفيذ.

يحاول معالجة المشكلة ضمن نطاق عمله.

المستوى الثاني

رئيس القسم.

يعالج العوائق التي تحتاج إلى تنسيق أو صلاحية أعلى.

المستوى الثالث

مدير الدائرة أو الإدارة.

يعيد ترتيب الموارد والأولويات.

المستوى الرابع

المدير العام أو الرئيس التنفيذي أو الإدارة العليا.

يتخذ القرار الذي يتجاوز صلاحيات المستويات السابقة.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

رسالة التصعيد الجيدة

يجب أن تجيب عن خمسة أسئلة:

1

ما المشكلة؟

2

ما أثرها على المشروع والهدف؟

3

ما الذي تم اتخاذه حتى الآن؟

4

ما القرار المطلوب؟

5

متى نحتاج إلى القرار؟

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

مثال على رسالة تصعيد


الموضوع: طلب اعتماد مورد بديل لمشروع نظام الانتظار

تأخر المورد الحالي في توريد الأجهزة لمدة ثمانية أسابيع، مما أثر في تنفيذ مشروع خفض زمن انتظار المستفيدين.
تم التواصل معه عدة مرات دون الحصول على موعد مؤكد للتوريد.
نقترح اعتماد المورد البديل المؤهل ضمن الميزانية المعتمدة.
نحتاج إلى القرار قبل نهاية الأسبوع حتى لا يمتد أثر التأخير إلى الربع القادم.

معهد رواد الإحسان للتدريب
RUWAD AL-AHSSAN TRAINING INSTITUTE

الخلاصة النهائية

التخطيط التشغيلي الناجح يعتمد على سلسلة واضحة:

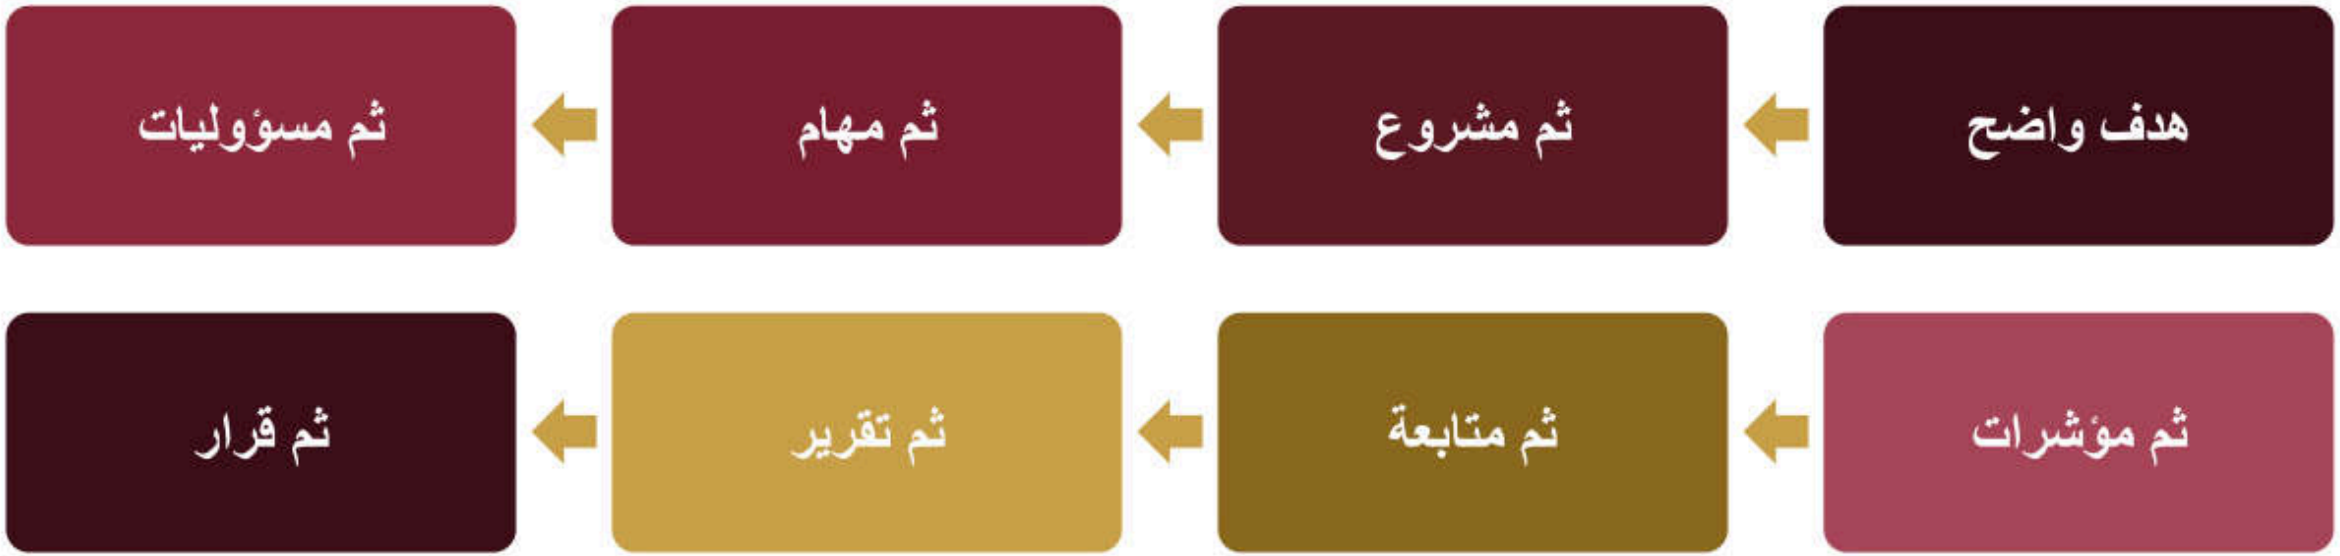

وإذا انقطعت أي حلقة من هذه السلسلة يتعثر التنفيذ.



الرسالة الختامية

الخطة ليست ملفًا نحفظه.

الخطة هي:

- هدف نعرف لماذا نريد تحقيقه.
- مشروع يترجم الهدف إلى عمل.
- مهام واضحة.
- مسؤول يعرف ما عليه.
- موعد محدد.
- رقم نقيسه.
- اجتماع نراجع فيه.
- وقرار نصحح به المسار.

ومن هنا تنتقل الجهة من التخطيط إلى التنفيذ

ومن التنفيذ إلى الأثر.

المدرب

عمر بن راشد الشعيبي
